


令和元年 8 月 23 日現在

### 聖ヨゼフ病院新棟建設工事進捗状況について

- (1) 工事の出来高は8月中旬の段階で全体の約53%（計画58.5%）となりました。  
8月上旬（夏季休暇前）に屋上階床のコンクリート打設を完了し現在は屋上階搭屋の躯体工事を行っております。  
また、継続して下層階より先行配線・配管や間仕切り壁工事の施工を行っております。
- (2) エントランス棟につきましては地上階のコンクリート打設を完了し中間階の躯体工事を行っており、9月中の上棟を予定しています。
- (3) 設計については外構関連や内装仕上げ詳細について調整中。

新棟進捗状況略図

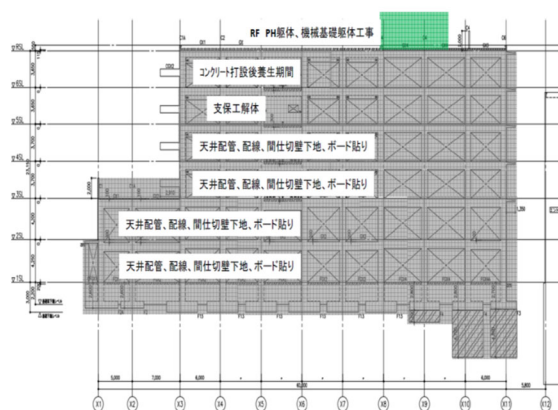

屋上階搭屋躯体工事



内部工事状況（1階外来）



エントランス棟中間階躯体工事

