


報告事項

聖ヨゼフ病院新棟建設工事進捗状況について

- (1) 工事の出来高は9月中旬の段階で全体の約58%となりました。
屋上階床のコンクリート打設後、搭屋型枠解体も完了し躯体工事は終了しました。
継続して下層階より内装工事を行っており、エレベーター工事が開始します。並行して外構工事を行っています。
- (2) エントランス棟につきましては1階天井（屋上階床）のコンクリート打設を完了し10月上旬に屋上階機械基礎のコンクリート打設後、躯体工事完了となります。
- (3) 設計についてはキープランや詳細について調整中。

新棟工事状況略図

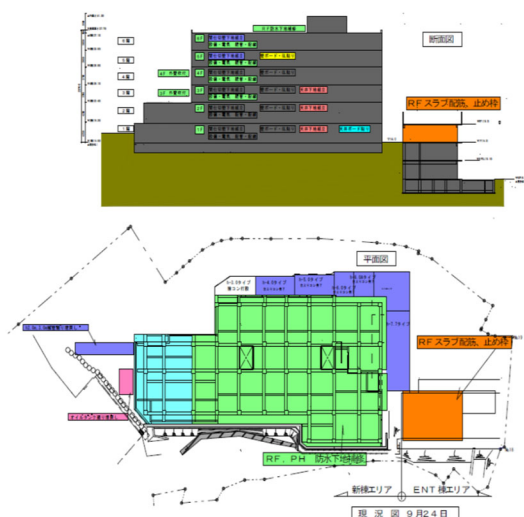

屋上階搭屋躯体工事



外構工事状況



新棟全景

